


Projeto Final I: O Mapa da Obra

Aula 10 – Cronograma e Viabilidade para TCCs em Sistemas de Informação

- > Status: Transformando ideias em planejamento executável.
- > Destino: TCC II (Próximo Semestre)

Um TCC sem cronograma não é um projeto. É uma intenção.

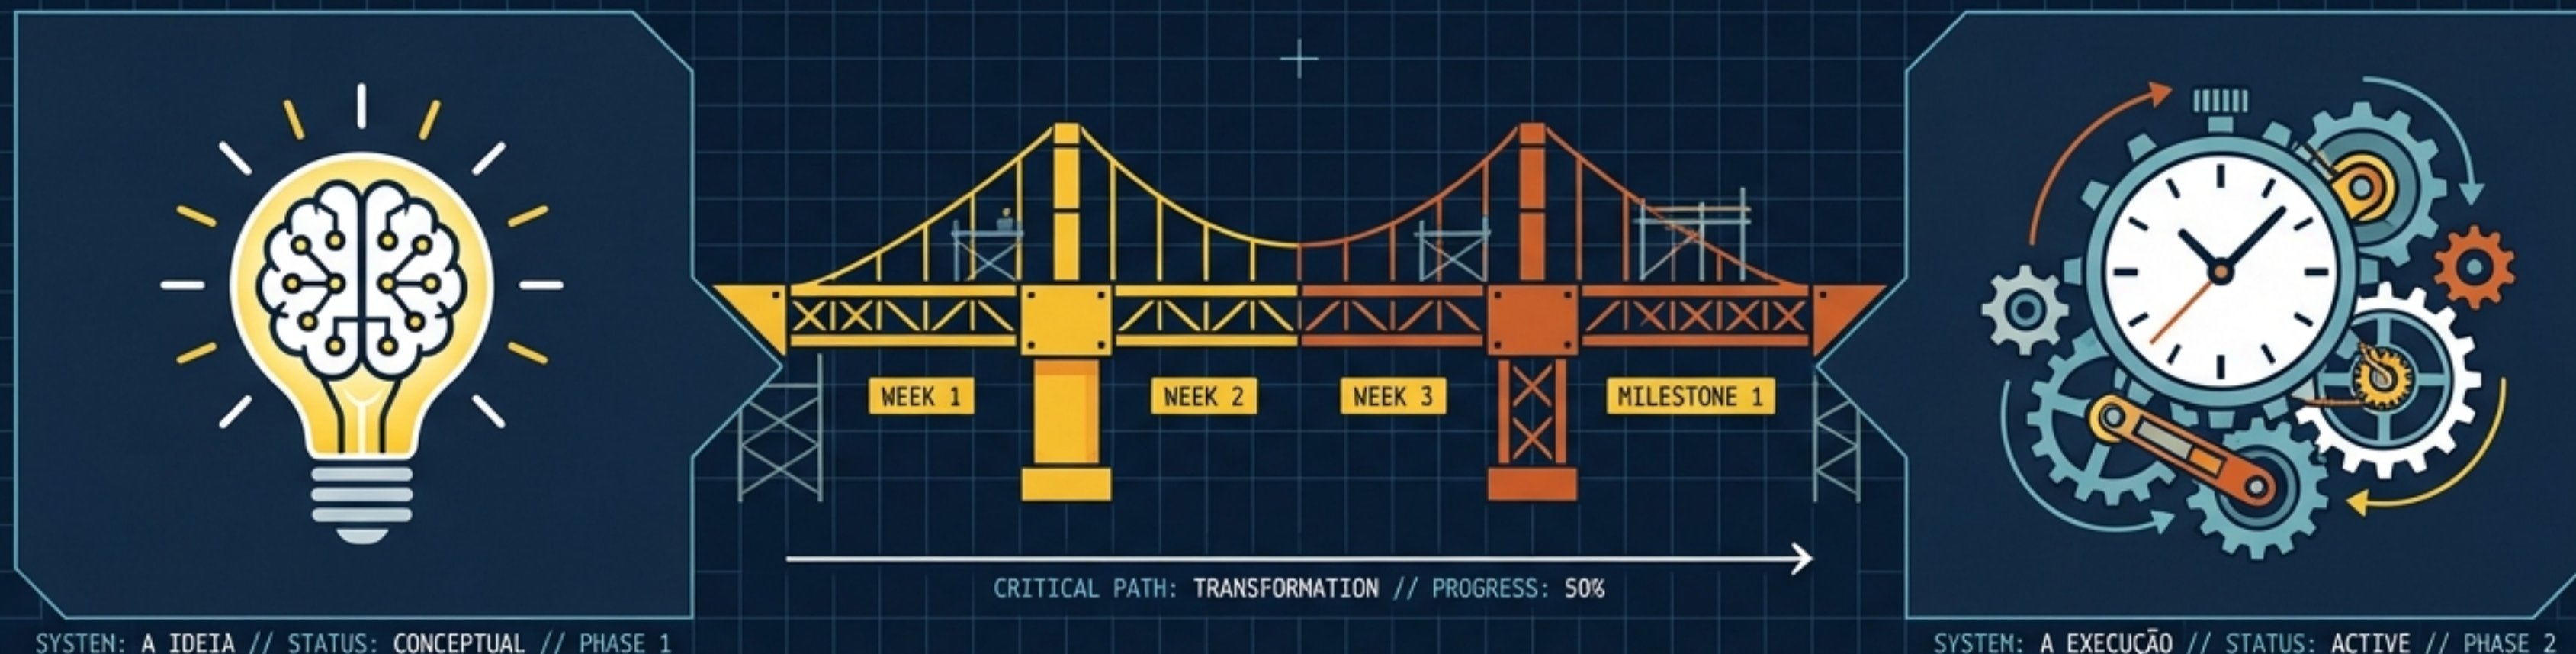

Demonstra Maturidade

Prova para a banca avaliadora que você entende o tamanho do desafio e sabe gerenciar a complexidade de um software.

EVIDENCE: RISK MGMT // ASSESSED

PANEL ID: 001 // DATA VALID



Garante o Foco

Define rigorosamente o que NÃO será feito, garantindo que o núcleo do sistema caiba no tempo disponível.

SCOPE: MVP DEFINED // CONSTRAINTS: LOCKED

PANEL ID: 001 // DATA VALID




Cria Previsibilidade

Transforma a ansiedade abstrata de "fazer um sistema" em metas semanais lógicas e controláveis.

METRICS: WEEKLY GOALS // TRACKING: ON SCHEDULE


PANEL ID: 001 // DATA VALID

As Etapas Típicas: O Caminho Crítico do TCC II

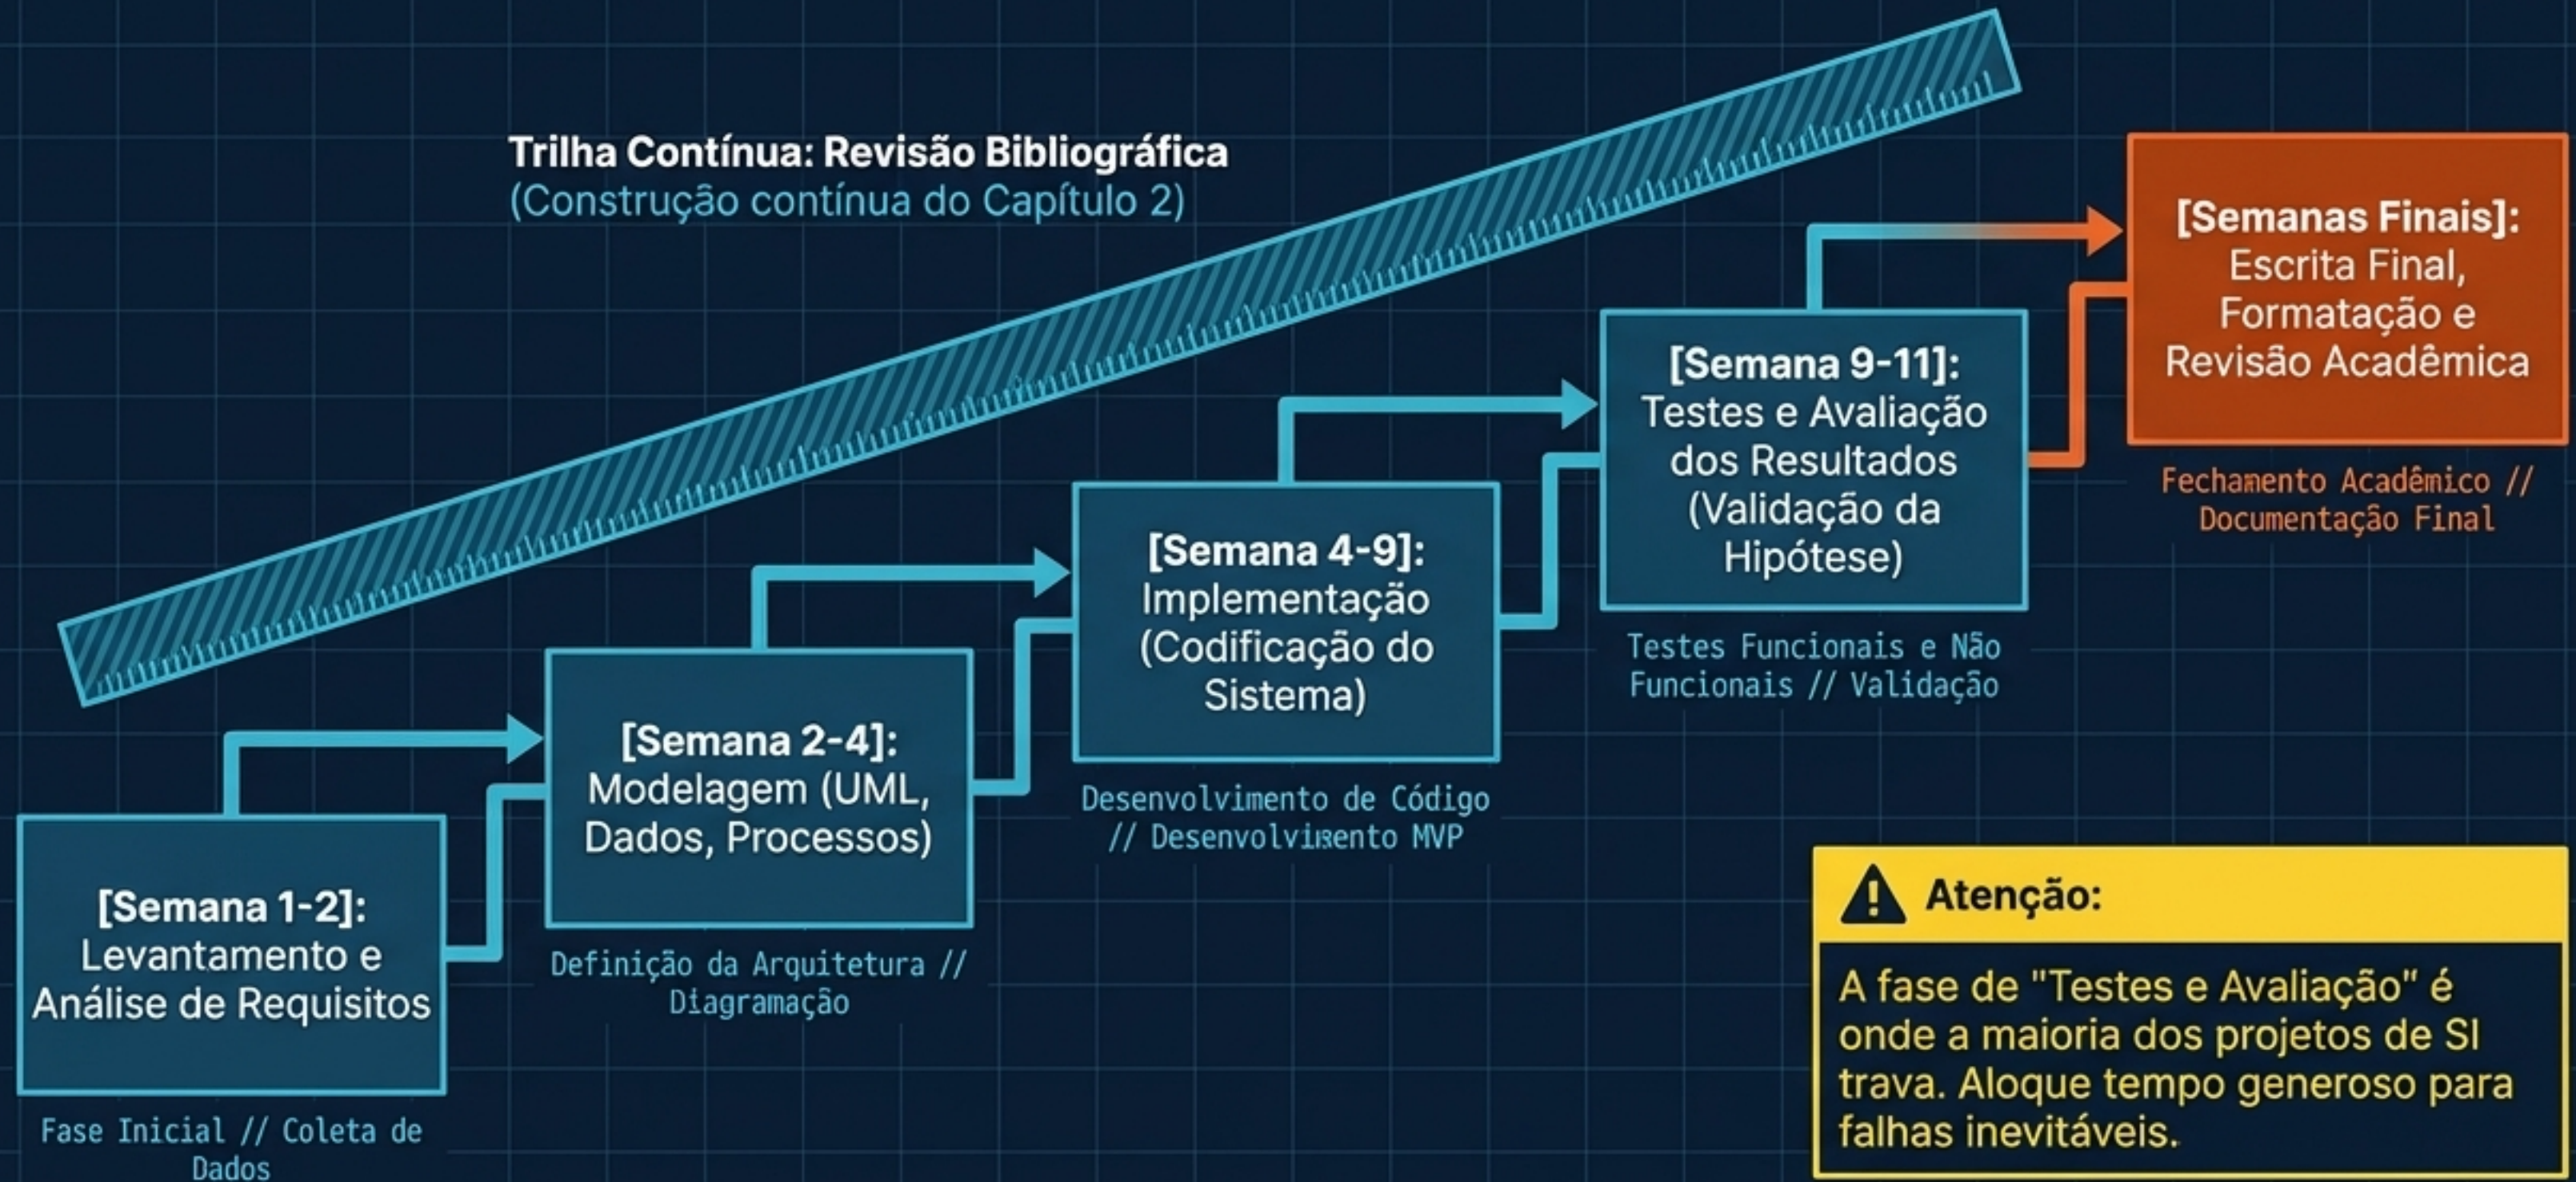


O Triplo Filtro da Viabilidade

“Um bom projeto científico só é válido se for viável.” — Souza Dias e Silva

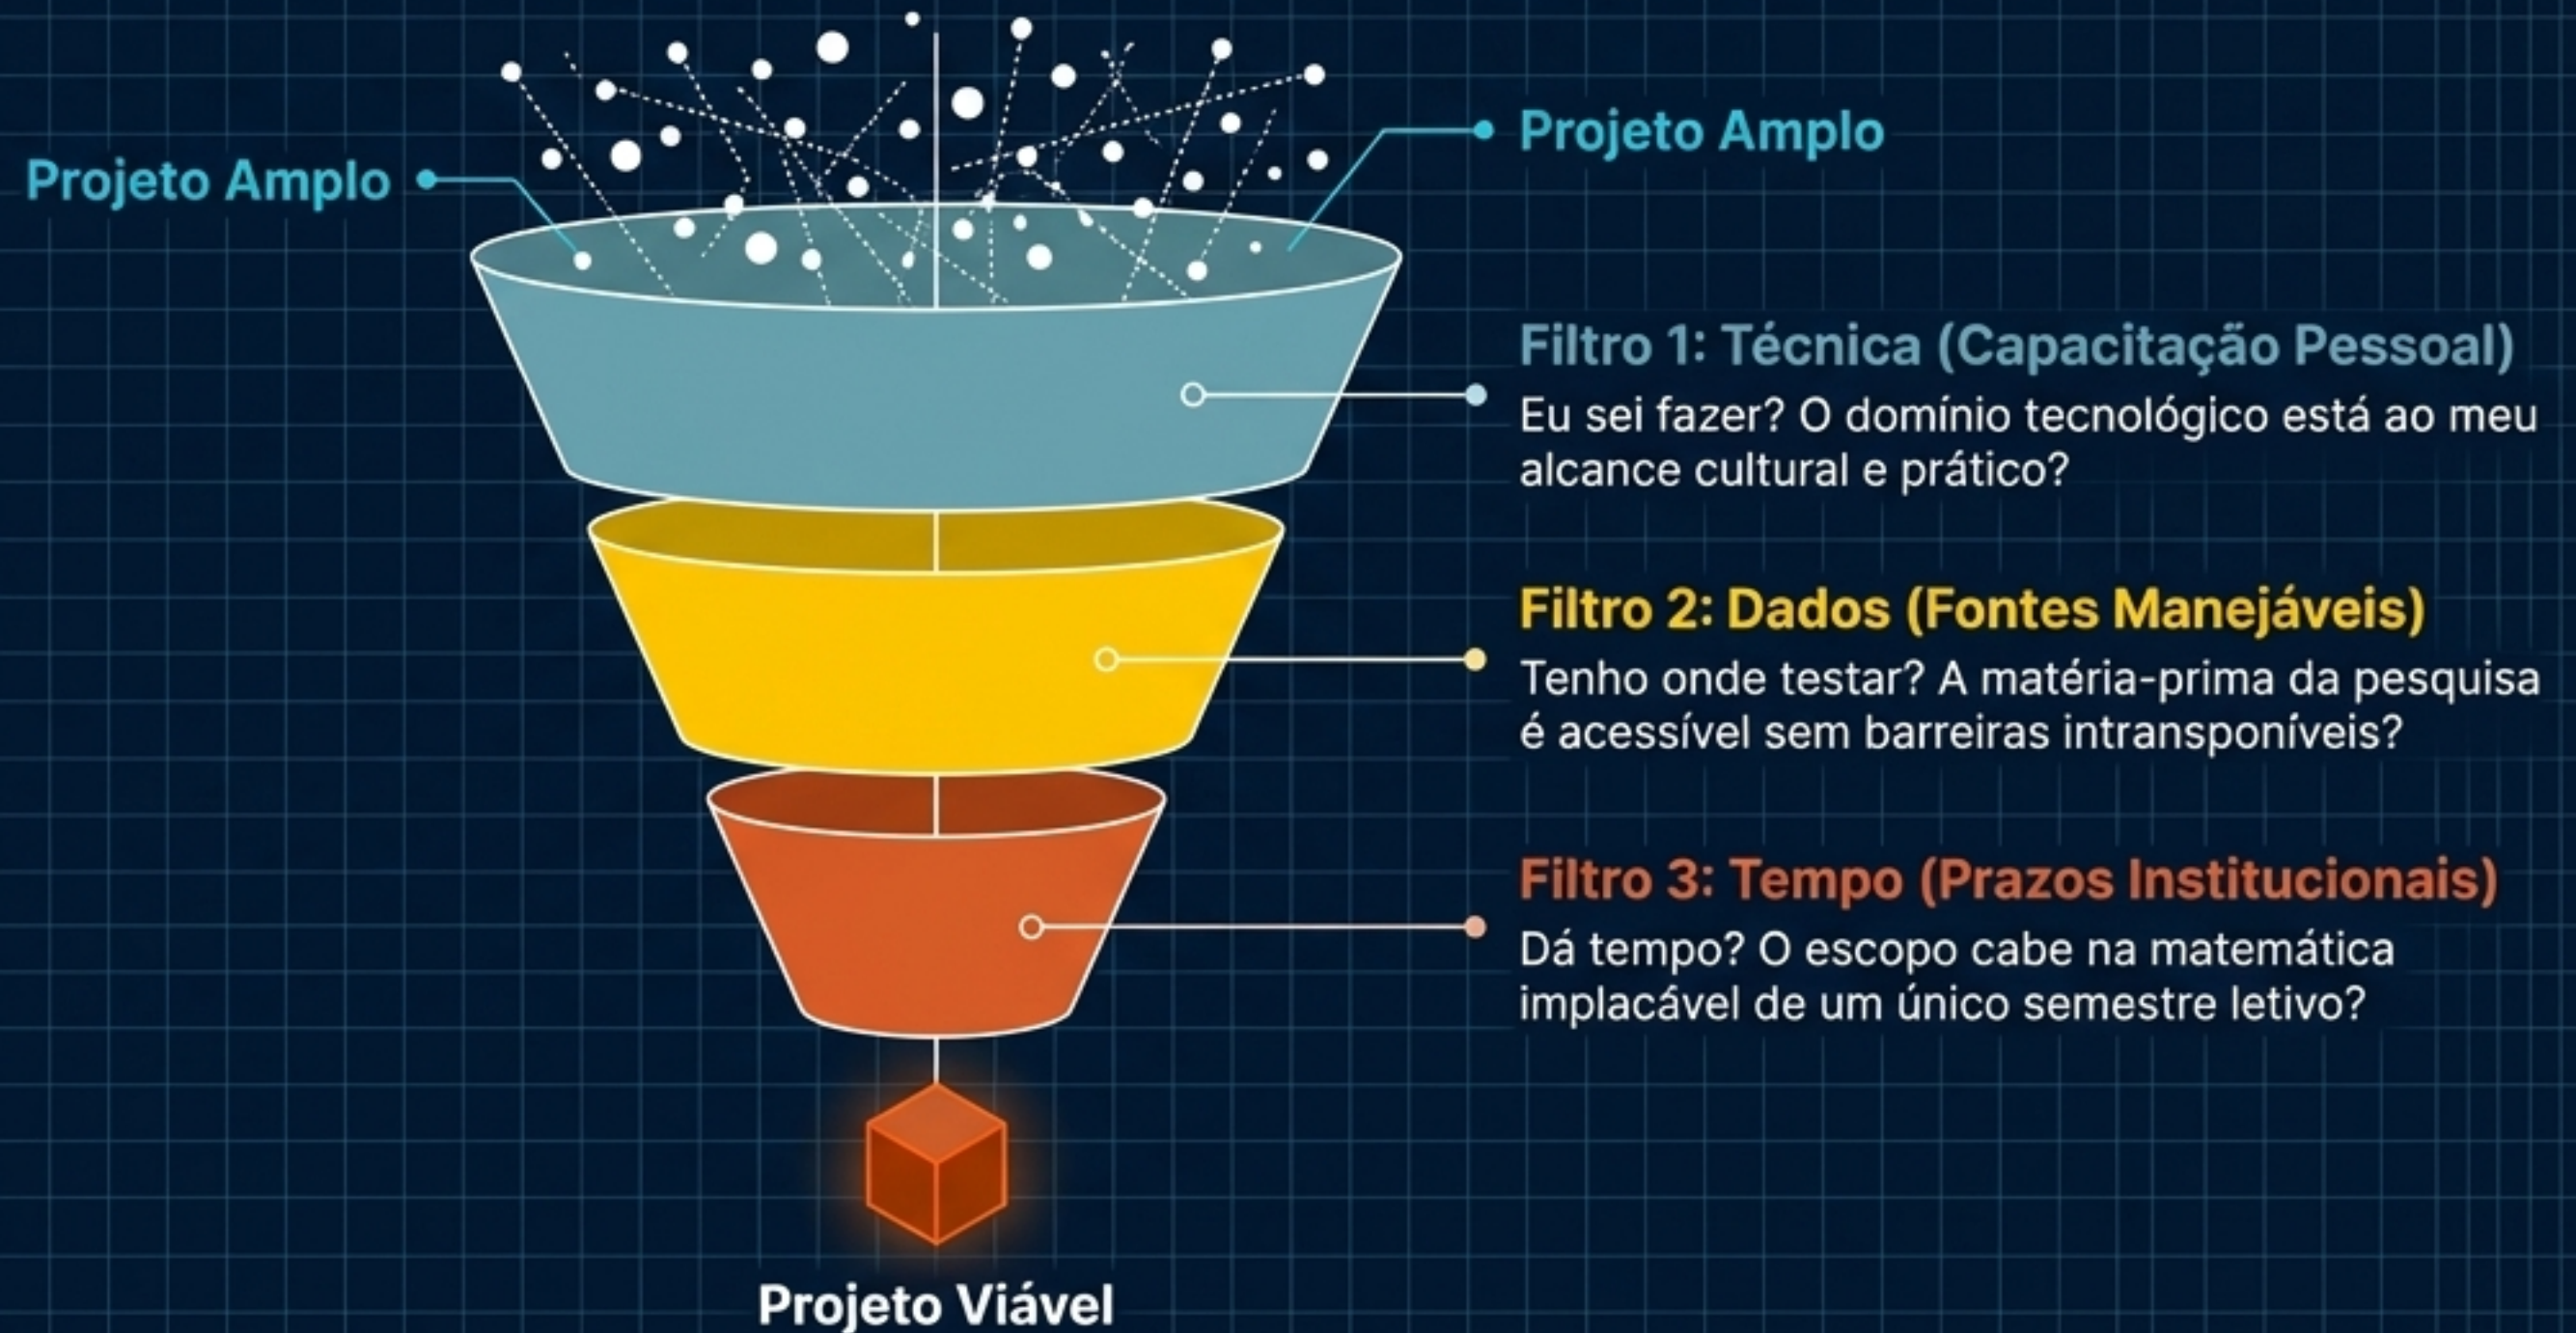

Filtro 1: O Mito da "Nova Tecnologia"

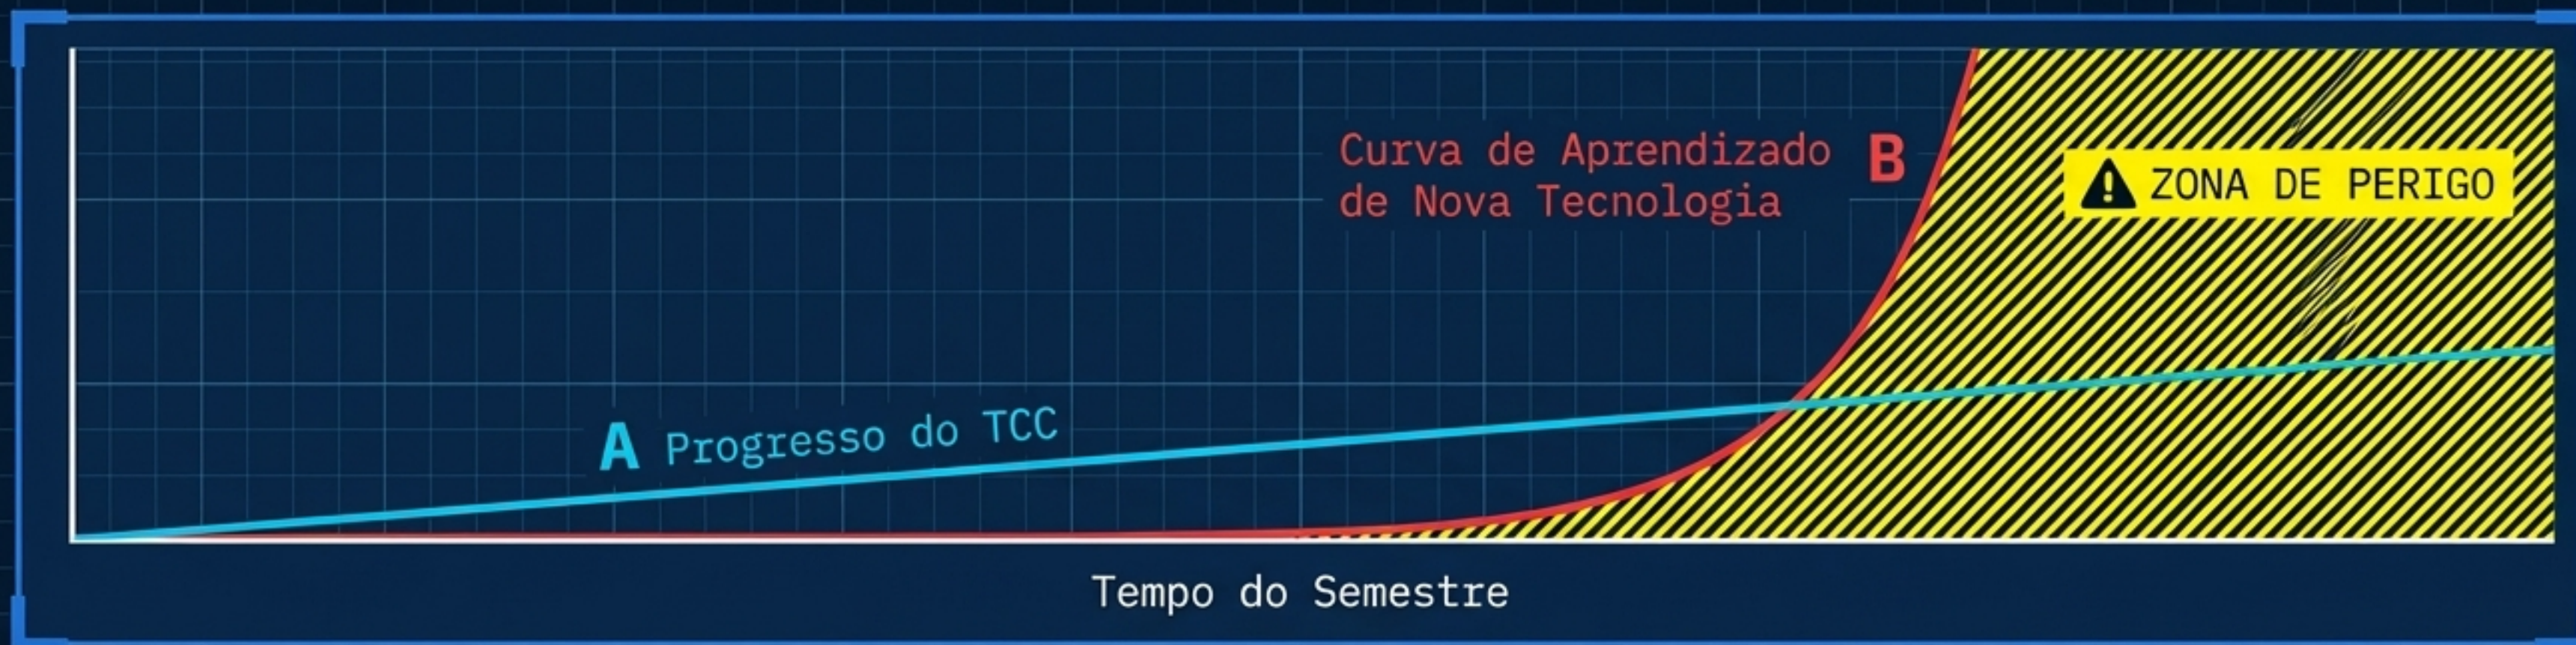

A Realidade

- A tecnologia escolhida é alcançável no curto prazo?
- Você já possui a base, ou vai aprender a linguagem/framework do absoluto zero?

A Regra de Ouro

O TCC não é um bootcamp. A menos que o próprio aprendizado da tecnologia seja o foco da sua metodologia de pesquisa, jogue com as armas que você domina.

Uma curva de aprendizado não gerenciável destrói o tempo de teste e validação da hipótese.

Filtro 2: Você tem a "matéria-prima" para a pesquisa?



1. Acesso Real e Autorizado: A empresa parceira vai realmente fornecer os dados? Você precisa de um Acordo de Confidencialidade (NDA) ou autorização do Comitê de Ética?



2. Volume e Tratamento: Você consegue tratar, limpar e estruturar esses dados em tempo hábil para análise?



3. O Plano B: Se o cliente/empresa mudar de ideia amanhã, o seu projeto morre ou sobrevive com dados simulados (mock data)?

Conclusão: Depender 100% de dados confidenciais externos é um risco de falha crítica. Prefira sempre fontes de dados públicas ou bases manejáveis.

Filtro 3: A Matemática Implacável do Semestre

Feriados/Recessos

Provas

Revisão/Banca



Tempo Real de Execução

20 Semanas (Duração Nominal do Semestre)

[-] Feriados e Recessos Institucionais (2 semanas)

[-] Semana de Provas de outras disciplinas (2 semanas)

[-] Revisão do Orientador e Formatação ABNT (3 semanas)

[=] **13 Semanas Úteis**

> SYSTEM WARNING: Você não tem 6 meses. Você tem cerca de 13 semanas de execução técnica livre. O escopo do seu sistema cabe rigorosamente dentro desta janela?

Síntese: O Diagnóstico Rápido do Seu TCC

SYSTEM STATUS: ACTIVE

	Capacidade Técnica	Acesso a Dados	Tempo (Escopo)
Baixo Risco	Courier New Domina a linguagem/ferramenta atual.	Courier New Bases públicas (Kaggle), open-source ou dados simulados.	Courier New Foco em um módulo específico e funcional (MVP).
Atenção	Courier New Conhece a base, precisa estudar bibliotecas específicas.	Courier New Dados internos próprios ou de acesso garantido e documentado.	Courier New Sistema completo, mas com dependências controladas.
Risco Crítico	Courier New Vai aprender do zero uma arquitetura desconhecida.	Courier New Depende de aprovação futura de diretoria externa.	Courier New "Sistema tipo Uber" / Plataforma gigantesca e indefinida.

Ferramentas e Formatos: Como documentar o tempo?

> FORMATO LIMPO

Tabelas Simples (Recomendado)

Fase	Data Início	Data Fim	Semanas
Fase 1: Pesquisa	01/Mar	31/Mar	4
Fase 2: Desenvolvimento MVP	01/Abr	31/Mai	8
Fase 3: Testes e Revisão	01/Jun	30/Jun	4

- **Foco:** Clareza imediata e progressão mês a mês.
- **Vantagem:** Excelente legibilidade no formato Word/PDF (ideal para a banca ler rapidamente).
- **Uso:** Perfeito para o Template Institucional.

> DEPENDÊNCIAS COMPLEXAS

Gráficos de Gantt (MS Project, Trello, Excel)



- **Foco:** Dependências paralelas e caminhos críticos.
- **Vantagem:** Ótimo para gerenciar o desenvolvimento prático do software no dia a dia.
- **Atenção:** Pode ficar ilegível se colado como imagem espremida no texto do TCC.

⚠️ Aviso: Ferramentas complexas não salvam cronogramas irreais. O importante é a lógica das etapas, não a estética do software de gestão.

Conexão Institucional: O Template UNILASALLE

UNILASALLE - Trabalho de Conclusão de Curso

Capítulo 3 - Planejamento

3.1 - Cronograma

Desenvolvimento das atividades previstas,

Início da implementação.

Revisão e ajustes.

1

Capítulo 3: O coração da sua execução. Transforma a metodologia teórica em passos práticos.


2

Seção 3.1: Exige uma visão macro. Cruze as etapas técnicas do projeto com os meses do próximo semestre letivo.

3

A Regra de Ouro do Escopo: Toda atividade listada neste cronograma DEVE estar conectada a um dos seus Objetivos Específicos (definidos no Capítulo 1). Se não há objetivo para a etapa, ela não deveria existir.

O Segredo de um Cronograma Aprovado: A Regra do "Buffer"

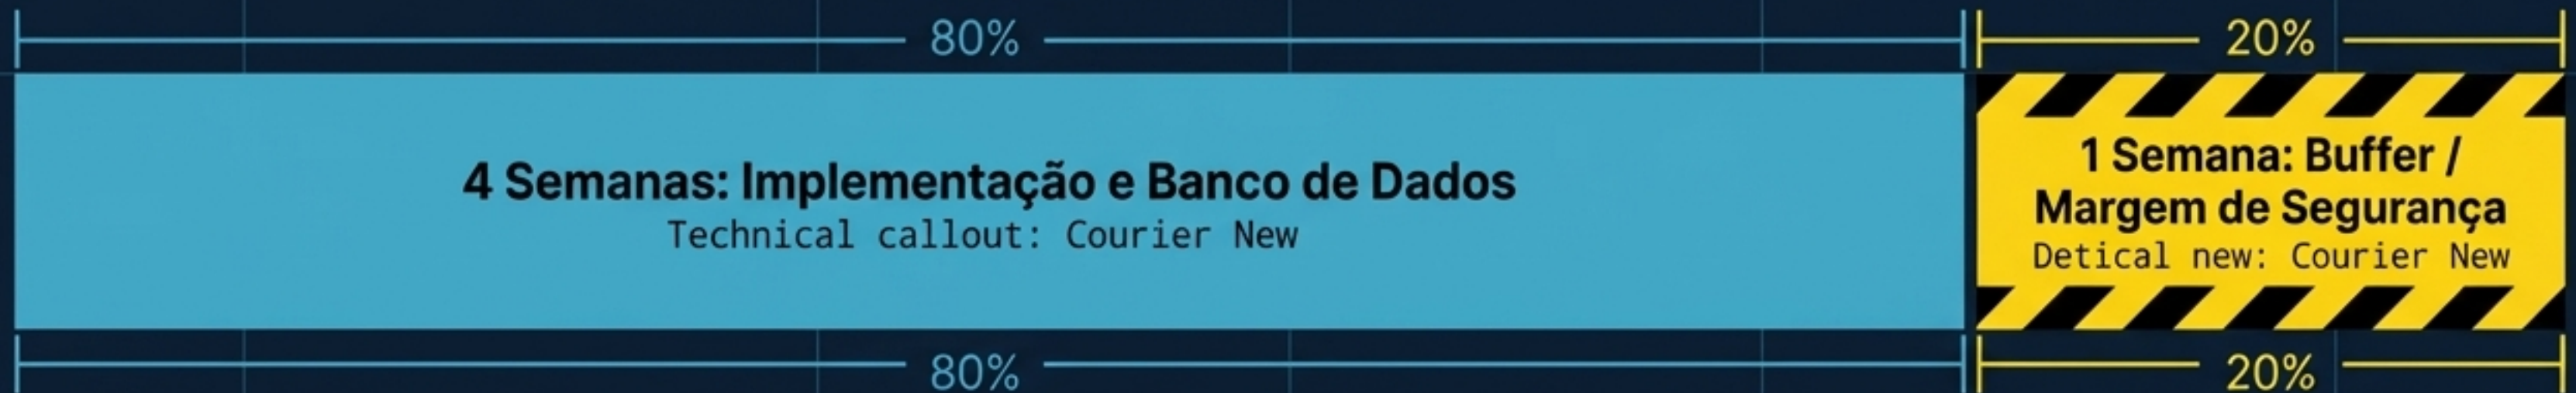

- ⚠ **Sistemas quebram.** APIs mudam. Dados demoram. Artigos são mais difíceis de ler do que parecem.
- ⚠ **A Folga Técnica:** SEMPRE adicione um "Buffer" (Folga) de 15% a 20% no seu tempo estimado de implementação técnica e fase de testes.
- ⚠ **O Fim de Jogo:** Deixe, obrigatoriamente, as 2 a 3 semanas finais do semestre exclusivas para a revisão textual acadêmica, coesão do documento e rigorosa formatação ABNT.
- ⚠ *Um projeto "just-in-time" no papel é um projeto atrasado na realidade.*

Oficina Prática: Construindo o seu Mapa de Bordo



Passo 1: Desconstrução

Liste todas as **atividades operacionais** necessárias para atingir os **Objetivos Específicos** definidos na Aula 5.

Passo 2: Estimativa Realista

Alóque um tempo realista (em semanas/meses) para o próximo semestre, lembrando da "**Matemática Implacável**" (13 semanas).

Passo 3: Aplicação dos Filtros

Passe suas etapas pelos 3 Filtros (Capacidade, Dados, Tempo). Tem alguma **zona de perigo vermelha**? Ajuste o escopo agora.

Passo 4: Documentação

Transponha o planejamento validado para uma tabela simples. Este é o seu esboço oficial para a **Seção 3.1**.

Validação Cruzada: O seu cronograma passa no teste?

Troque seu esboço com um colega. Avalie o projeto dele com o rigor de uma Banca Examinadora.

- ☒ As etapas incluem tempo específico para modelagem, testes de software e revisão teórica?
- ☒ O prazo final deixa uma margem (buffer) de segurança antes da data limite da Banca Institucional?
- ☒ A tecnologia escolhida evita uma curva de aprendizado irreal para o tempo disponível?
- ☒ O cronograma está perfeitamente coerente com a Metodologia definida na Aula 9?

Se você fosse a banca, você acreditaria financeiramente e tecnicamente que esse colega entrega o projeto finalizado em julho?

Próximos Passos: Preparando a Consolidação Final

90%



O que entregar hoje:

O esboço estruturado e validado da sua Tabela de Cronograma (correspondente à Seção 3.1).

Para casa (A Reta Final):

Inserir a tabela no Template Oficial do Anteprojeto UNILASALLE.
Revisar a coerência de ponta a ponta (Problema -> Metodologia -> Tempo).

Próxima Aula (Aula 11):

Normalização ABNT, Revisão Geral e o olhar implacável da Banca. O anteprojeto deixará de ser um rascunho para se tornar um documento científico oficial.

**O TCC não é um evento de última hora.
É um processo de engenharia bem documentado.**
